

Proyecto Creación de un Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operacional




*Al servicio
de las personas
y las naciones*

PLAN OPERATIVO ANUAL 2015



Plan Plurianual 2013-2015

Objetivos Estratégicos y Metas / Categorías de AP y Estándares / Componentes y Funciones / Dimensión Territorial / Gestión de la Información (RNAP) / Arreglos Institucionales (Comité Nacional de AP)

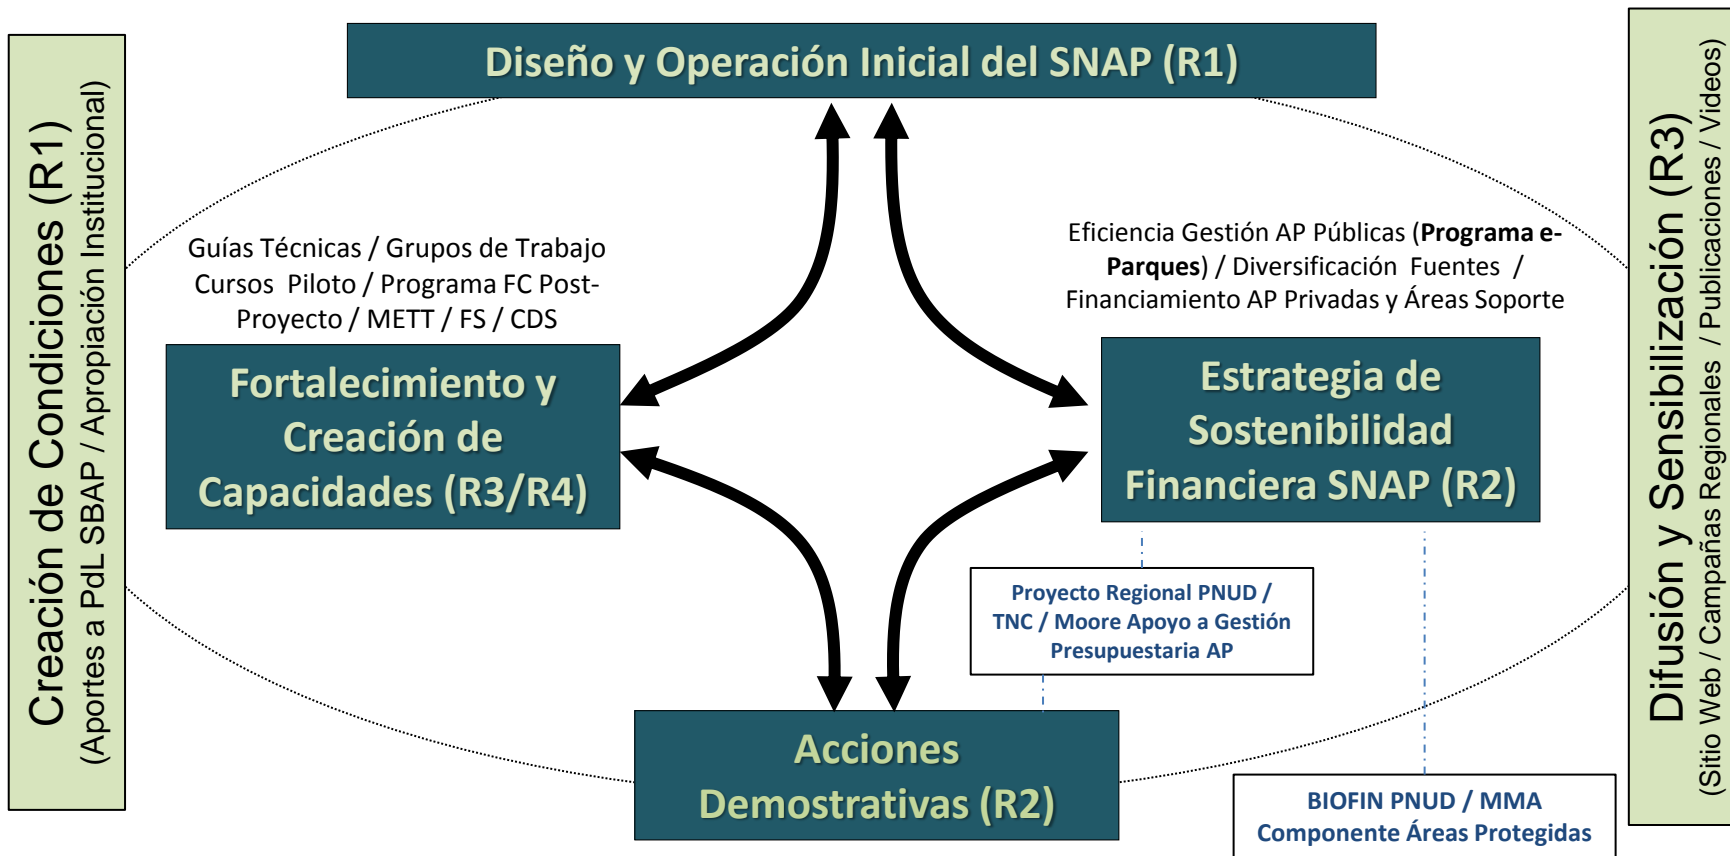

- Financiamiento RM La Rinconada y Modelos para Subsistema Marino de AMP
- Inversión en MN Quebrada de Cardones y RN Río Clarillo y Modelo de Inversión para SNASPE
- Gestión, Financiamiento y Gobernanza Paisaje de Conservación Alhué y Modelo para Chile

Planificación 2015 - Proyecto GEF SNAP (Síntesis)

RESULTADO 1

Marco estratégico y operativo de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP) en funcionamiento



- Grupos de Tarea apoyo **PdL SBAP**
- Funcionamiento **CNAP**
- Aplicación criterios homologación AP
- Generación insumos para **RNAP**
- Herramienta automatizada para cálculo representatividad
- Propuestas de **funciones operativas SNAP**

GESTIÓN PROYECTO

- Sistematización del Proyecto (elaboración y publicación informe final)
- Auditorías

RESULTADO 2

Mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de financiamiento de las AP del SNAP



- Plan de incidencia **Estrategia Financiera** (apoyo e-Parques y BIOFIN)
- Desarrollo esquemas de **concesiones e ingresos propios**
- Soporte elaboración Ppto. 2016 (SNAP)
- Desarrollo práctico herramientas para PSE y **esquemas de compensaciones**
- Propuesta **incentivos ICP y Fondo BD-AP**
- Plan de Inversión RM La Rinconada (SERNAPESCA)
- Planes de Inversión MN-QC y RN-RC (CONAF)
- Apoyo EAE y despliegue **PLADECO-Paisaje Conservación Alhué**

RESULTADO 3

Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de gestión del SNAP (enfoque público-privado)



- Guía Técnica para **instrumentos de fomento** en áreas de valor para biodiversidad (INDAP-MMA)
- Publicación Guía Técnica **Paisaje de Conservación** y PLADECO (MMA)
- Guía Técnica **SNAP y PROT** (SUBDERE-MMA)
- Grupo de Trabajo con **ICP** (en el marco del CNAP)
- Programa de **Difusión y Sensibilización Ciudadana** (publicaciones, redes sociales, encuentros regionales, encuentro nacional)
- Diseño y puesta en marcha **Plataforma 2.0 RNAP**

RESULTADO 4

Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la planificación, gestión e inversión costo-eficiente en las AP del SNAP



- Estándares y Guía Técnica **PdM, Gestión Financiera y Monitoreo y Evaluación AP**
- Validación en 4 AP del SNASPE y aplicación piloto en **1 SN, 1 Sitio Ramsar y 1 AMP**
- Curso **manejo adaptativo y planificación financiera AP** para 45 profesionales (MMA / CONAF / SERNAPESCA)
- Programa capacitación de **Guardaparques** Instructores (30) e inducción a GP en regiones (200) (CONAF – Chile Valora)
- Curso para **promotores o gestores de ICP** (30)
- Diseño Programa **Fortalecimiento Institucional para SNAP y SBAP**
- Aplicación METT, FS y CDS (indicadores ML)
- **Encuesta Nacional** BD y AP
- **Evaluación Final** del Proyecto

PROYECTO GEF SNAP - PLAN OPERATIVO ANUAL 2015

RESULTADO 1: MARCO LEGAL, ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE UN NUEVO SNAP FINANCIERAMENTE SUSTENTABLE

PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1

Productos	Actividades	Indicadores de Cumplimiento	Responsable	Plazos	
				Inicio	Término
Producto 1.1.a Insumos para un marco estratégico y legal del SNAP	1.1.a.1 Funcionamiento Grupo de Tarea para apoyar técnicamente discusión sobre PdL SBAP en relación con el SNAP (objetivos, categorías e instrumentos), y el informe financiero del nuevo Servicio	Informe técnico y registro de talleres / reuniones del Grupo de Tarea	CNP	ene-15	oct-15
Producto 1.1.b Diseño conceptual del SNAP	1.1.b.1 Análisis de la dimensión regional y local del SNAP	Informe técnico	Consultor	mar-15	may-15
Producto 1.2 Propuesta de arreglos institucionales facilitadores para el desarrollo costo-eficiente de los diferentes subsistemas del SNAP	1.2.1 Apoyo al funcionamiento del Comité Nacional de Áreas Protegidas y del Plan de Acción 2014-2018	Actas de reuniones efectuadas	CNP	ene-15	oct-15
	1.2.2 Elaboración de propuestas sobre funciones de la unidad de dirección político-estratégica del SNAP, de la unidad ejecutiva y operativa del SNAP a nivel central y regional, y de las unidades individuales de AP	Informe técnico entregado al MMA	Consultor	mar-15	jun-15
Producto 1.3 Identificación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y definición de estrategias para su inclusión en el SNAP	1.3.1 Publicación Documento de Trabajo "Representatividad Actual de los Pisos Vegetacionales en el SNAP y Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad" (GEF SNAP / MMA)	1.000 ejemplares impresos	Imprenta	en-15	mar-15
	1.3.2 Creación de herramienta automatizada SIG para cálculo de representatividad	Módulo SIG creado y en uso por parte del MMA	Consultor	en-15	mar-15
Producto 1.4 Estrategia de financiamiento para el SNAP y puesta en marcha de un plan operativo de corto plazo	1.4.1 Diseño de un plan de incidencia de la Estrategia Financiera y su Plan Operativo a nivel institucional	Informe con diseño del Plan y taller de validación con UAP	Consultor	ene-15	feb-15
Producto 1.5 Estándares operativos para las categorías del SNAP y para la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros a las AP	1.5.1 Aplicación piloto de criterios de homologación de los Santuarios de la Naturaleza a las categorías de UICN (utilizando criterios de Zorondo, 2013)	Informe técnico entregado al MMA	Consultor	ene-15	mar-15
Producto 1.6 Sistemas de información para evaluación del costo-beneficio de la conservación de la biodiversidad en el SNAP	1.6.1 Lanzamiento y reforzamiento del Registro Nacional de Áreas Protegidas (versión inicial): a) actualización deslindes SN, b) estándar Dublin Core de documentos de AP y Sitios Prioritarios para Plataforma 2.0, c) levantamiento y sistematización de especies en AP, d) elaboración cartografía oficial de AP y Sitios Prioritarios, e) elaboración manual de gestión para SN, f) homologación y reparación geodatabase Iniciativas de Conservación Privada	Informes técnicos entregados al MMA y bases de datos ingresadas al Registro	Consultor	ene-13	jun-15

RESULTADO 2: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA AUMENTAR NIVEL DE FINANCIAMIENTO DE LAS AP DEL SNAP					
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2					
Productos	Actividades	Indicadores de Cumplimiento	Responsable	Plazos	
				Inicio	Término
Producto 2.1a Valoraciones de las AP realizadas					
Producto 2.1b Mecanismos y estrategias para aumentar las asignaciones del presupuesto público a las AP y al SNAP	2.1.1 Publicar Documento Técnico-Político de la Estrategia Financiera para sensibilizar tomadores de decisión	500 ejemplares impresos y distribuidos	Imprenta	ene-15	mar-15
	2.1.2 Implementar plan de incidencia de la Estrategia Financiera con actores institucionales clave	Estrategia Financiera en agenda del CNAP y Programa e-Parques en funcionamiento	Consultor	mar-15	ago-15
Producto 2.2 Mecanismos para aumentar la generación de ingresos propios en las AP públicas	2.2.1 Apoyar la elaboración del presupuesto 2016 de los subsistemas del SNAP (SNASPE, AMP, SN) considerando: a) personal, b) operación, c) requerimientos de inversión, y d) gestión de ingresos propios	Presupuesto 2016 en formulario DIPRES y memoria de cálculo	Consultor	mar-15	ago-15
	2.2.2 Desarrollo de propuesta de arreglos o adecuaciones institucionales, legales o reglamentarias para facilitar el esquema de concesiones y la generación y gestión de ingresos propios en Áreas Protegidas terrestres y marinas	Informe Técnico aprobado	Consultor	mar-15	may-15
Producto 2.3 Nuevos mecanismos de ingresos definidos para generar fuentes de financiamiento para las AP públicas del SNAP	2.3.1 Apoyo a Estudio Básico sobre Servicios Ecosistémicos de las AP en la RMS (elaborado por Seremi Medio Ambiente), mediante levantamiento a nivel de detalle de la vegetación natural para valoración y priorización de los ecosistemas terrestres y generación de un marco de compensación por pérdida de biodiversidad	Informe Técnico aprobado	Subcontrato	mar-15	ago-15
	2.3.2 Establecer un protocolo básico para creditizar cambios en la biodiversidad asociados a la protección de las zonas costeras a través de la creación de zonas de no extracción (AMP Las Cruces)	Informe Técnico aprobado	Consultor	mar-15	ago-15
	2.3.3 Elaborar y desarrollar métricas de conversión para creditizar cambios en la biodiversidad asociados a la protección de zonas mediterráneas en zonas de amortiguación e iniciativas de conservación privadas (Altos de Cantillana)	Informe Técnico aprobado	Consultor	mar-15	ago-15
Producto 2.4 Nuevos instrumentos para canalizar recursos de forma sostenida a las AP del subsistema privado del SNAP	2.4.1 Análisis económico-legal y bases estratégicas para el diseño de un Fondo de Conservación de la Biodiversidad para Chile	Informe Técnico aprobado	Consultor	ene-14	feb-15
	2.4.2 Propuesta de incentivos para iniciativas de conservación privada a partir de propuestas sugeridas en el catastro de ICP (2013)	Informe Técnico aprobado	Consultor	mar-15	jun-15
	2.4.3 Desarrollo de una propuesta técnica y legal para la creación de un Fondo de Conservación, criterios de elegibilidad y de asignación de recursos, y que permita, además del aporte basal del presupuesto regular del Estado, captar donaciones con fines de conservación	Informe Técnico aprobado	Subcontrato	mar-15	jun-15
Producto 2.5 Acciones demostrativas implementadas en diferentes subsistemas de AP y ecorregiones del país para su replicabilidad en el SNAP	2.5.1 Elaboración de plan de inversión para RM La Rinconada y diseño de proyectos para postular a financiamiento FNDR, incluyendo sistematización de la acción demostrativa (estudio de caso)	Plan de Inversión y 2 Proyectos ingresados a FNDR (SERNAPECSA)	Subcontrato	ene-15	jun-15
	2.5.2 Elaboración de plan de inversión para MN Quebrada de Cardones y diseño de proyectos para postular a financiamiento FNDR, incluyendo sistematización del proceso (estudio de caso)	Plan de Inversión y 2 Proyectos ingresados a FNDR (CONAF)	Subcontrato	ene-15	jun-15
	2.5.3 Elaboración de plan de inversión para RN Río Clarillo y diseño de proyectos para postular a financiamiento FNDR, incluyendo sistematización del proceso (estudio de caso)	Plan de Inversión y 2 Proyectos ingresados a FNDR (CONAF)	Subcontrato	ene-15	jun-15
	2.5.4 Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas en un Manual con Modelo de Plan de Inversión para AP del SNASPE, y realización de taller inductivo para representantes regionales	Manual elaborado y validado por CONAF	Consultor	ene-15	jun-15
	2.5.5 Fortalecimiento capacidades Municipio de Alhué (curso SIG, EAE, profesional de apoyo), sistematización de acción demostrativa y difusión a Municipios de Chile	Apoyo profesional por 10 meses, taller con Municipios e Informe de Sistematización	Consultor / Subcontrato	ene-15	oct-15

RESULTADO 3: NUEVAS ASOCIACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y SECTORES PRODUCTIVOS PARA COMPARTIR COSTOS DEL SNAP
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 3

Productos	Actividades	Indicadores de Cumplimiento	Responsable	Plazos	
				Inicio	Término
Producto 3.1 Directrices para optimizar ingresos desde fondos públicos de desarrollo y fomento para apoyar financiamiento de AP	3.1.1 Desarrollo de Guía Técnica para la focalización de recursos de fondos públicos del INDAP en territorios de alto valor para la biodiversidad (zonas de amortiguación, áreas de conectividad y paisajes de conservación) mediante prácticas productivas sostenibles (ganadería, agricultura, turismo y otros) para reducir amenazas a las AP	Guía Técnica aprobada y en uso por parte del INDAP y MMA	Subcontrato	ene-15	jun-15
Producto 3.2 Integración del SNAP y sus subsistemas en las estrategias de desarrollo, superación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida a nivel nacional y regional	3.2.1 Publicación y distribución de Guía Técnica de Paisajes de Conservación y Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO)	1.000 ejemplares impresos y distribuidos	Imprenta	ene-15	mar-15
	3.2.2 Elaboración de Guía Técnica para inserción del SNAP en Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) en el marco del Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad (con SUBDERE)	Guía Técnica aprobada y 500 ejemplares impresos	Consultor / Imprenta	mar-15	jun-15
Producto 3.3 Grupos de trabajo permanentes del SNAP con promotores de iniciativas de conservación privada, iniciativas regionales de conservación, y sectores productivos relevantes	3.3.1 Puesta en marcha y funcionamiento de un Grupo de Trabajo sobre Iniciativas de Conservación Privada (ICP) en el marco del CNAP	Actas de reuniones efectuadas	CNP	mar-15	oct-15
	3.3.2 Seguimiento a Mesa Público-Privada Paisaje de Conservación de Alhué y Mesa Público-Privada Península de Mejillones (RM La Rinconada)	Actas de reuniones efectuadas	CNP	ene-15	oct-15
Producto 3.4 Programa de sensibilización nacional y regional sobre el SNAP	3.4.1 Campaña de sensibilización ciudadana sobre el valor patrimonial de las AP en Metro de Santiago	Campaña ejecutada	Subcontrato	may-15	jun-15
	3.4.2 Estrategia de posicionamiento en redes sociales (Community Manager, sitio web, boletines digitales, difusión radial, cobertura de eventos y comunicaciones)	Estrategia ejecutada	Subcontrato	ene-15	oct-15
	3.4.3 Encuentros regionales (Arica, Antofagasta, La Serena, Valdivia y Concepción) y Encuentro Nacional sobre AP	5 Encuentros Regionales y 1 Encuentro Nacional ejecutados	Subcontrato	ene-15	oct-15
	3.4.4 Diseño y puesta en operación de la Plataforma 2.0 del Registro Nacional de AP del MMA	RNAP 2.0 operativo en sitio Web del MMA	Subcontrato	ene-15	jun-15
	3.4.5 Publicaciones: a) Libro sobre AP, b) Documento MMA sobre AP, c) Objetivos Estratégicos SNAP, d) Criterios de Homologación UICN, e) Catastro ICP y f) Estrategia Financiera SNAP	6 libros publicados (1.000 ejemplares cada uno)	Imprenta	ene-13	abr-15

RESULTADO 4: AUMENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES PARA MANEJO E INVERSIÓN COSTO-EFETIVA EN AP DEL SNAP					
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 4					
Productos	Actividades	Indicadores de Cumplimiento	Responsable	Plazos	
				Inicio	Término
Producto 4.1 Guías Técnicas (o Caja de Herramientas) para la efectividad de manejo y la sostenibilidad financiera de las AP y del SNAP	4.1.1 Estándares de gestión y Guía Técnica con metodología de planificación del manejo, gestión financiera y monitoreo y evaluación de las Áreas Protegidas del SNASPE (y recomendaciones para AMP, Sitios Ramsar y Santuarios de la Naturaleza)	Guía Técnica aprobada	Consultor	ene-15	ago-15
	4.1.2 Guía técnica para costeo de Planes de Manejo y uso de indicadores para solicitar recursos a DIPRES	Guía Técnica aprobada	Consultor	mar-15	abr-15
	4.1.3 Aplicación piloto de Guía Técnica en 1 SN, 1 Sitio Ramsar y 1 AMP	Aplicaciones Piloto ejecutadas	Subcontrato	may-15	oct-15
Producto 4.2 Capacitación del personal clave de los subsistemas del SNAP y de las AP para un manejo costo-eficiente y la reducción de las amenazas a la biodiversidad	4.2.1 Curso de capacitación interinstitucional en manejo adaptativo y planificación financiera de AP y redes de AP, incluyendo definición de perfiles laborales para esta función en el SNAP	Curso realizado con al menos 45 personas capacitadas (10 nivel central y 30 nivel regional)	Subcontrato	may-15	jun-15
	4.2.2 Programa de formación de capacitadores y replicabilidad en cursos macrozonales para Guardaparques y administradores de AP, incluyendo definición de estándares de competencias laborales para los Guardaparques	Programa realizado con al menos 30 capacitadores formados y 200 personas capacitadas en cursos macrozonales	Subcontrato	mar-15	jun-15
	4.2.3 Curso de capacitación para promotores de iniciativas de conservación privada (ICP) y uso de Guías Técnicas desarrolladas	Curso realizado con al menos 30 personas capacitadas	Subcontrato	jul-15	ago-15
Producto 4.3 Programa de fortalecimiento de capacidades para el SNAP y estrategia de implementación post Proyecto	4.3.1 Diseño de un Programa de Fortalecimiento Institucional para el despliegue del SNAP y del SBAP	Informe Técnico entregado al MMA	Consultor	mar-15	jul-15
	4.3.2 Sistematización de indicaciones al Proyecto de Ley del SBAP	Informe Técnico entregado al MMA	Consultor	mar-15	jun-15
	4.3.3. Análisis de requerimientos operativos para la conformación de la dotación del personal del SBAP y del SNAP	Informe Técnico entregado al MMA	Consultor	mar-15	jun-15
Producto 4.4 Sistema de manejo, evaluación y adaptación de conocimientos para el Proyecto	4.4.1 Encuesta nacional sobre conservación de la biodiversidad y AP	Encuesta aplicada e Informe Técnico	Subcontrato	mar-15	abr-15
	4.4.2 Evaluación Final	Informe Aprobado	Consultores	oct-15	dic-15
	4.4.2 Aplicación METT, Ficha Financiera, Ficha Desarrollo de Capacidades (M&E) y Sistematización Informe Final del Proyecto	Informes Técnicos aprobados	CNP / Consultor	may-15	jun-15



www.proyctogefareasprotegidas.cl

 @gefsnap

 GEF SNAP Chile
